


Gerência de Projetos de Software

Prof. Paulo Afonso

Roteiro

- Grupo de Processos de Execução
 - › Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto
 - › Mobilizar a Equipe do Projeto
 - › Desenvolver a Equipe do Projeto
 - › Gerenciando Informações do Projeto

Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto

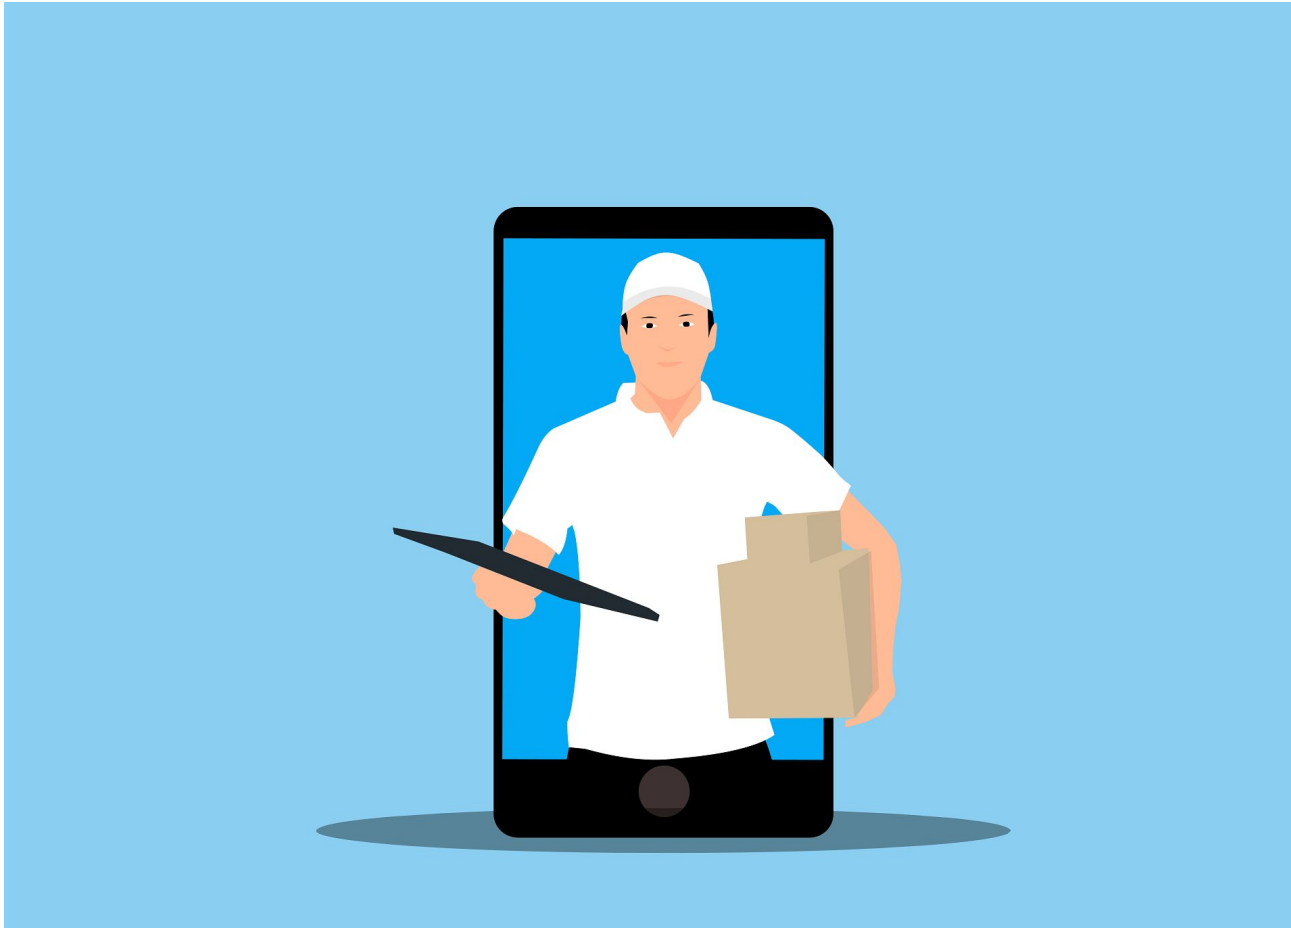

Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto

- Nesta aula, iniciaremos o Grupo de Processos de Execução, com o processo **Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto**.

Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto

- É aqui que o **projeto ganha** vida e o trabalho acontece.
 - › Os recursos são comprometidos e as pessoas são alocadas nas atividades, a fim de gerar o produto, serviço ou resultado do projeto.
- Se você fez um bom trabalho de planejamento, as coisas devem ocorrer com relativa tranquilidade.

Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto

- Contudo, não é hora de relaxar e curtir. É preciso **manter o foco**.
- O trabalho do GP agora é uma questão de *supervisionar o projeto, produzindo entregas, comunicando, emitindo solicitações de mudança, gerenciando o cronograma*, entre outros.

Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto

- O processo “Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto” possui quatro entradas:
 - › Solicitações de mudança aprovadas (veremos adiante)
 - › Fatores ambientais da empresa
 - › Ativos de processos organizacionais
 - › Entre outros

Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto

- As ferramentas e técnicas do processo Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto são:
 - › opinião especializada, sistema de informações do gerenciamento de projetos (manual ou informatizado) e reuniões.

Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto

- As saídas do processo Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto são:
 - › Entregas
 - › Dados de desempenho do trabalho
 - › Solicitações de mudança
 - › Atualizações nos documentos do projeto

Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto

Saída: **Entregas**

- Nesta saída, deve-se reunir e registrar **informações relacionadas às entregas**, tais como:
 - › data de término das atividades;
 - › situação das entregas e sua qualidade;
 - › custos; entre outras informações.

Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto

Saída: **Entregas**

- As entregas nem sempre são tangíveis, mas sempre únicas e verificáveis.
- Exemplo:
 - › pode ser que os membros da equipe necessitem de treinamento para utilizar um equipamento especializado.
 - › a **conclusão do treinamento** também pode ser registrada como uma entrega do projeto.

Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto

Saída: **Dados do Desempenho do Trabalho**

- Dizem respeito à **observação**, à **coleta**, à **documentação** e ao **registro** do andamento das atividades do projeto.
- Os tipos de informação que você pode coletar durante esse processo são bem variados:
 - › Progresso e *status* das atividades do cronograma, porcentagem de conclusão do trabalho em geral, número de solicitações de mudança, percentual de conclusão das atividades do cronograma, lições aprendidas, etc.

Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto

Saída: **Dados do Desempenho do Trabalho**

- Os dados sobre o desempenho do trabalho tornam-se uma **entrada** para os processos de **Monitoramento e Controle**.

Execução



Monitoramento & Controle



Dados de desempenho



Solicitações de mudança



Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto

Saída: **Solicitação de Mudanças**

- Durante a execução do projeto, o GP vai acabar se deparando com **itens que precisam ser modificados**.
 - › As mudanças podem também surgir das solicitações das partes interessadas, fontes externas, avanços tecnológicos, etc.
- Essas solicitações de mudança podem abranger mudanças no cronograma, no escopo, nos requisitos, etc.

Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto

Saída: **Solicitação de Mudanças**

- A implementação das solicitações de mudança aprovadas são executadas neste processo.
 - › Ou seja, esse processo é responsável tanto por gerar solicitações de mudanças, que passarão por um processo de aprovação (veremos em breve), como por implementar as solicitações de mudança aprovadas.
- As solicitações de mudança podem exigir: **medidas corretivas** ou **medidas preventivas**.

Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto

Saída: **Solicitação de Mudanças**

- **Medidas corretivas:**

- › São tomadas para colocar os futuros resultados do projeto de acordo com o planejado.
 - Exemplo: você descobre que um dos seus programadores está incluindo uma funcionalidade não planejada no software, porque é “amigável” com o usuário.
 - Você precisará redirecioná-lo para as atividades que lhe foram atribuídas a princípio, a fim de evitar atrasos no cronograma.

Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto

Saída: **Solicitação de Mudanças**

- **Medidas preventivas:**
 - › Referem-se a tudo aquilo que puder reduzir o possível impacto negativo de eventos de risco, caso estes se concretizem.
 - Exemplo: realizar refatoração de código.

Mobilizar Equipe do Projeto



Mobilizar Equipe do Projeto

- Envolve a **obtenção** e **alocação** de *recursos humanos*.
 - › A equipe do projeto pode ser interna ou contratada para o projeto.
- Cabe ao GP **garantir que os recursos** estejam **disponíveis** e sejam **qualificados** para executarem as atividades do projeto às quais estão alocados.
- As entradas desse processo são o “Registro das partes interessadas”, os “Fatores ambientais da empresa” e os “Ativos de processos organizacionais”.

Mobilizar Equipe do Projeto

- O registro das partes interessadas descreve as **funções** e as **responsabilidades**, incluindo os **períodos necessários aos membros** da equipe do projeto.
- É importante ressaltar que o GP pode não ter autoridade direta sobre os recursos do projeto, devido à estrutura organizacional da empresa.

Mobilizar Equipe do Projeto

- Algumas ferramentas e técnicas: *negociação, contratação e equipes virtuais*.
- **Negociação:**
 - › Negociar com os gerentes funcionais e outros gerentes de departamento da organização, recursos para o seu projeto e as datas para sua alocação.
 - › A **disponibilidade** é parte da equação. Será preciso convencer o gerente a disponibilizar o profissional quando o cronograma determinar que este é necessário.

Mobilizar Equipe do Projeto

- **Negociação:**
 - › O segundo termo da equação é o grau de **competência** do profissional designado para o projeto: *disponibilidade não é competência*.
 - › As negociações devem incluir discussões sobre as habilidades e características pessoais dos membros da equipe que você quer no seu projeto.

Mobilizar Equipe do Projeto

- **Contratação:**

- › Envolve a aquisição de indivíduos ou grupos para determinadas atividades do projeto.
- › Podem ser empregados em tempo integral ou como apoio contratado durante o projeto ou fase do projeto, ou para atividades específicas.
- › Costuma ser necessária quando **a organização não dispõe de funcionários com a devida qualificação** para trabalhar no projeto.

Mobilizar Equipe do Projeto

- **Equipes virtuais:**
 - › São equipes que **não trabalham na mesma localização**, mas todos os membros compartilham os objetivos do projeto.
 - › Esse tipo de equipe permite a inclusão de profissionais de diferentes localizações geográficas, diferentes turnos, etc.
 - São muito utilizadas no contexto de *DDS - Desenvolvimento Distribuído de Software*.

Mobilizar Equipe do Projeto

- Duas saídas importantes desse processo são: “Designação do pessoal do projeto” e “Calendários dos recursos”.
- **Designação do pessoal do projeto:**
 - › Consiste na alocação dos integrantes da equipe nas atividades.
 - › Juntamente com essa saída, uma lista da equipe é publicada, contendo todos os nomes de integrantes da equipe.

Mobilizar Equipe do Projeto

- **Calendários dos recursos:**
 - › Descrevem a disponibilidade dos membros da equipe e os horários agendados para eles trabalharem no projeto.

Desenvolver a Equipe do Projeto



Desenvolver a Equipe do Projeto

- Implica em criar um ambiente franco e estimulante para que as partes interessadas contribuam.
 - › Em outras palavras, é transformar a equipe em um grupo **coordenado, funcional e eficiente**.
- Os projetos são realizados por **indivíduos**; quanto melhor estes trabalharem juntos, mais tranquila e eficiente tenderá a ser sua execução.

Desenvolver a Equipe do Projeto

- As entradas desse processo são as mesmas do processo “Mobilizar a Equipe do Projeto”.
- Já quanto às técnicas e ferramentas, esse processo contempla:
 - › Habilidades interpessoais, Treinamento, Regras básicas, Reconhecimento e recompensas, entre outras.

Desenvolver a Equipe do Projeto

- **Habilidades interpessoais:**
 - › Muitas vezes conhecidas como inteligência emocional, tais habilidades pessoais incluem *liderança, influência, negociação, resolução de conflito, empatia e criatividade, etc.*
 - › Mesmo que certas habilidades não façam parte da sua natureza, não significa que você não conseguirá observar esse comportamento em outras pessoas e **incorporá-lo às suas técnicas de gerenciamento.**

Abrindo um parênteses...

Desenvolvimento da habilidade de resolução de conflitos

- Em geral, se houver duas ou mais pessoas trabalhando em um projeto, **conflitos podem ocorrer**.
- O conflito entra em cena quando os *desejos*, as *necessidades* e os *objetivos* de uma parte são **incompatíveis com os de outra (ou outras)**.
- Portanto, é importante conhecer também algumas técnicas básicas para se tratar conflitos.

Abrindo um parênteses...

Desenvolvimento da habilidade de resolução de conflitos

- **Forçar/Direcionar:** uma das partes impõe uma solução às demais.
 - › “*É porque eu sou o chefe e ponto final*”. Embora seja uma solução permanente, nem sempre é a melhor.
 - › É uma técnica **ganha-perde**. A parte “impositora” vence e os perdedores são aqueles forçados a se submeter à sua decisão.

Abrindo um parênteses...

Desenvolvimento da habilidade de resolução de conflitos

- **Suavizar/Acomodar:** é um modo **temporário** de resolver conflitos em que são *ênfatizadas as áreas do acordo* em relação às áreas de diferença.
 - › O conflito não é resolvido, mas sim, **atenuado**.
 - › Essa é uma técnica do tipo **perde-perde**, porque nenhuma das partes sai ganhando.

Abrindo um parênteses...

Desenvolvimento da habilidade de resolução de conflitos

- **Comprometer/Reconciliar:** o comprometimento é obtido quando todas as partes envolvidas **abrem mão de algo para chegar a uma solução.**
 - › Nessa situação, **nenhum dos lados vence nem perde:** ninguém fica muito entusiasmado com a decisão alcançada.
 - › Contudo, se ambas as partes fizerem comprometerimentos firmes em relação à resolução, a solução torna-se então **permanente.**

Abrindo um parênteses...

Desenvolvimento da habilidade de resolução de conflitos

- **Colaborar/Resolver o problema:** resulta de um consenso real entre os membros da equipe sobre a decisão.
 - › Em geral, a solução para o problema é **respaldada pelos fatos**.
 - › Assim sendo, a solução se torna **permanente** e o conflito acaba. Essa é uma solução **ganha-ganha**.

Fechando o parênteses...

Desenvolvimento da habilidade de resolução de conflitos

- **Retirar/Evitar:** ocorre quando as partes *se retiram ou se evitam*; nunca chegam a uma solução.
 - › É a **pior alternativa possível**, mas às vezes, a única que se consegue obter.
 - › É um exemplo de uma técnica de resolução de conflitos em que **todos perdem (perde-perde)**.

Desenvolver a Equipe do Projeto

- **Treinamento:**

- › Trata de oferecer o treinamento necessário para os integrantes da equipe executarem as atividades de que foram incumbidos.
 - Parte-se de uma avaliação das **competências** e **possibilidades** dos membros da equipe, aliadas às **necessidades do projeto**.
- › O treinamento pode ser formal (em sala de aula, *on-line* ou no trabalho) ou informal (observação de outros ou perguntando como executar uma tarefa).

Desenvolver a Equipe do Projeto

- **Regras básicas:**

- › São **expectativas estabelecidas pelo GP** e pela equipe do projeto, que descrevem o comportamento aceitável da equipe.
- › Regras básicas ajudam a equipe a **entender as expectativas** em relação ao comportamento aceitável e aumenta a produtividade (por exemplo, evitando interrupções em uma reunião).

Estudo de caso

- Descrição de um diálogo real:
 - Você ouviu?, Story pergunta ao seu amigo Jimmy, – Roger foi designado à equipe do projeto.
 - Só se for sobre o meu cadáver – Jimmy retruca, largando o computador. Parte para sua sala (do GP), sem nem esperar a resposta de Story.
 - Jimmy entra em sua sala e você o questiona - Posso ajudá-lo?

Estudo de caso

- Descrição de um diálogo real:
 - Story acaba de me contar que Roger entrou na equipe do projeto. Não posso trabalhar com Roger. É um sujeito arrogante que não respeita o trabalho de ninguém, exceto o seu próprio. Ele me humilha na frente dos outros, e eu não mereço isso. Escrevo um bom código e não preciso do Roger me vigiando. Quero ficar nessa equipe, mas não se Roger estiver também.

Estudo de caso

- Descrição de um diálogo real:
 - Você pensa por um minuto e responde: – Quero que você trabalhe nesse projeto; é uma grande oportunidade para você. Mas, não existe outra pessoa para trabalhar na fase de análise além de Roger. Ele é o único remanescente que ainda conhece bem o código legado dos *mainframes*. Sem os conhecimentos de Roger sobre o sistema existente, estouraríamos o orçamento e as estimativas de tempo já estabelecidas para o projeto. Como preciso de vocês dois nesse projeto, eis o que proponho....

Estudo de caso

- Descrição de um diálogo real:
 - Delinearei claramente os papéis e responsabilidades para todos os principais membros da equipe na reunião inicial.
 - Também deixarei bem claro que não serão permitidas interações negativas da equipe. E se tiver um problema com Roger que você mesmo não possa resolver, você deve me avisar imediatamente.

Desenvolver a Equipe do Projeto

- **Reconhecimentos e recompensas:**
 - › A motivação de um indivíduo pode ser *extrínseca* ou *intrínseca*.
 - › Os motivadores intrínsecos são **peculiares a cada indivíduo** (valores pessoais e religiosos são exemplos de motivação intrínseca).
 - › Os motivadores extrínsecos são **fatores externos**, que podem incluir bonificações, oportunidades de treinamento, reconhecimentos, dentre outros.

Desenvolver a Equipe do Projeto

- **Reconhecimentos e recompensas:**
 - › A técnica de *reconhecimentos e recompensas* é um modo de motivação extrínseca.
 - › Você deve desenvolver e **documentar os critérios para recompensas**, especialmente quando os incentivos são monetários.
 - Se não houver critérios estabelecidos para distribuí-los, pode-se gerar prejuízos para a equipe.
 - Exemplo: o favorecimento de um mesmo membro pode desmotivar o restante da equipe.


Desenvolver a Equipe do Projeto

- **Reconhecimentos e recompensas:**
 - › Uma estratégia interessante, nesse caso, é **reconhecer toda a equipe** e não apenas um membro.
 - › As preferências individuais e diferenças culturais devem ser levadas em conta na utilização de sistemas de reconhecimento e recompensas.
 - Há quem não goste de ser elogiado diante dos outros, enquanto outros fazem questão.

Desenvolver a Equipe do Projeto

- Esse processo tem apenas duas saídas: *avaliações do desempenho da equipe e atualizações nos ativos organizacionais da empresa.*
- **Avaliações do desempenho da equipe:**
 - › Envolve determinar a eficiência de uma equipe.
 - › Em geral, ao longo do projeto, os indivíduos vão aprimorando suas habilidades e aperfeiçoando comportamentos e relacionamentos da equipe.
 - › A avaliação dessas características ajudará a definir onde (se for o caso) a equipe precisa ser aprimorada.

Gerenciando Informações do Projeto

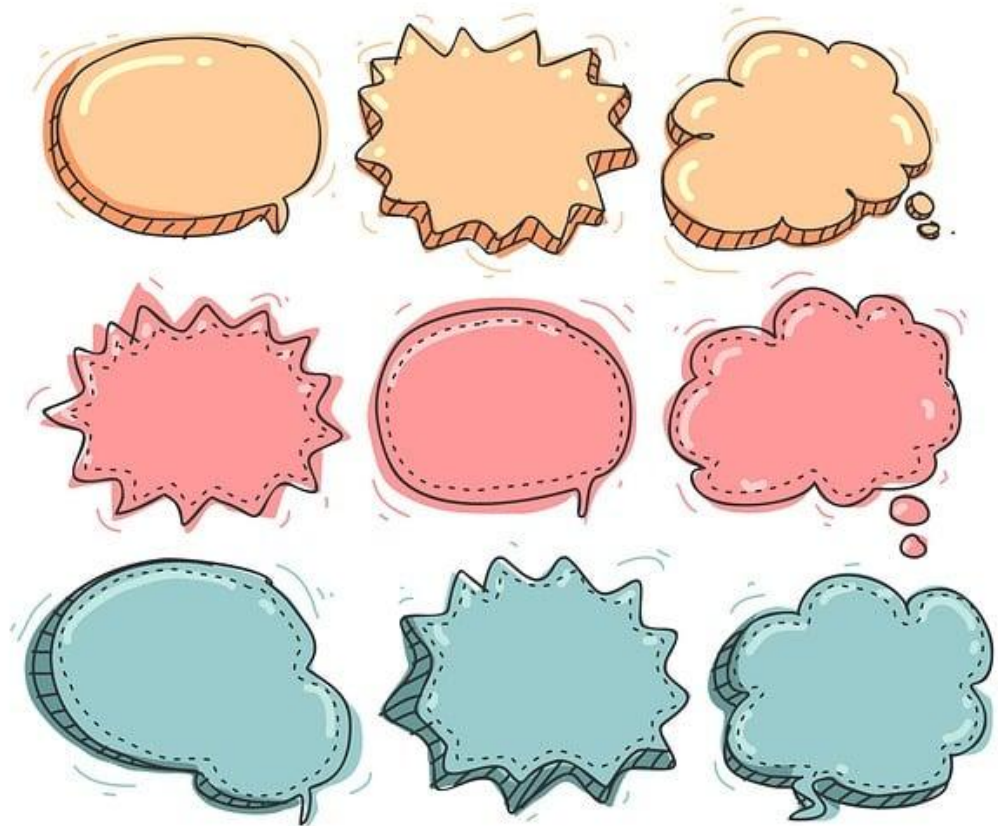

Gerenciando Informações do Projeto

- Uma das **funções principais** desse processo é **distribuir informações** sobre o projeto às partes interessadas de maneira oportuna.
 - › Informar as partes interessadas sobre a posição atual do projeto em relação ao orçamento e ao cronograma e o que já foi realizado pela equipe do projeto até a data, por exemplo.

Gerenciando Informações do Projeto

- Todos os aspectos do trabalho de um GP **envolvem comunicação**. Estima-se que os gerentes dedicam até 90% de seu tempo comunicando-se, de alguma forma.
- Portanto, as **habilidades de comunicação** são, de certa forma, as mais importantes para um GP.
- Comunicação é o **processo de troca de informações**.

Gerenciando Informações do Projeto

- Toda a comunicação inclui três elementos:
 - › **Emissor:** responsável pela apresentação das informações.
 - As informações devem ser completas e expostas de maneira que o receptor consiga entendê-las: o conhecimento que ele tem do assunto, influências culturais, idioma, emoções, atitudes e localização geográfica devem ser levados em conta.
 - As mensagens também devem ser relevantes para o receptor.

Gerenciando Informações do Projeto

- Toda a comunicação inclui três elementos:
 - › **Mensagem:** é a informação que é enviada e recebida.
 - Pode ser *escrita, verbal, não verbal, formal, informal, interna, externa, horizontal ou vertical*.
 - As comunicações *horizontais* são mensagens trocadas **entre pares**.
 - As comunicações *verticais* são enviadas e recebidas entre o nível da gerência executiva e seus subordinados.

Gerenciando Informações do Projeto

- Toda a comunicação inclui três elementos:
 - › **Receptor:** é a pessoa à qual a mensagem se destina.
 - É responsável por compreender as informações corretamente e **certificar-se de que recebeu todos os dados**.
 - O termo “Roger” (usado na aviação) indica que a mensagem foi recebida e compreendida. Em muitos casos, espera-se que o receptor repita a instrução com suas próprias palavras (*readback*).

Gerenciando Informações do Projeto

- Você pode utilizar várias *técnicas para aprimorar suas habilidades de comunicação*. Eis algumas delas:
 - › **Pareça interessado no que está sendo dito.**
 - Como? Olhando nos olhos da pessoa, acenando a cabeça em sinal de concordância e fazendo comentários (caso seja pertinente), etc.
 - O falante vai ficar mais à vontade – o que é vantajoso para você também.
 - Além disso, você acaba absorvendo uma quantidade maior das informações transmitidas.

Gerenciando Informações do Projeto

- Você pode utilizar várias *técnicas para aprimorar suas habilidades de comunicação*. Eis algumas delas:
 - › **Faça uma recapitulação (com suas palavras) do que o orador falou.**
 - Você pode começar mais ou menos assim: “*Vamos ver se eu entendi bem: você está dizendo que...*” — e pedir-lhe que confirme se está certo.

Gerenciando Informações do Projeto

- Você pode utilizar várias *técnicas para aprimorar suas habilidades de comunicação*. Eis algumas delas:
 - › **Evite interromper!**
 - Interromper é uma maneira de dizer ao seu interlocutor que você não está interessado em ouvi-lo e que o que você tem a dizer é mais importante.
 - As interrupções podem fazer com que o outro perca a linha de raciocínio, esqueça o que estava dizendo e até se irrite.

Gerenciando Informações do Projeto

- Algumas entradas deste processo incluem...
 - › Relatórios de desempenho do trabalho, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais.
- Há algumas novas ferramentas e técnicas:
 - › **Tecnologias de comunicação**, Modelos de comunicação, Métodos de comunicação, Sistemas de gerenciamento de informações e Relatórios de desempenho.

Gerenciando Informações do Projeto

- **Tecnologias de comunicações:**
 - › Trata dos elementos tecnológicos utilizados para transmitir as informações para/de/entre as partes interessadas, e que **podem afetar as comunicações do projeto**.
 - Exemplos: palavra escrita ou falada, mensagens de email, relatórios formais de *status*, reuniões, bancos de dados *online*, agendas *online* etc.
 - › Vários fatores devem ser ponderados antes de se escolher os métodos a serem empregados para a transmissão de informações.

Gerenciando Informações do Projeto

- **Tecnologias de comunicações:**
 - › Exemplos:
 - Disponibilidade da tecnologia.
 - Experiência da equipe com a tecnologia.
 - Configuração da equipe (local ou espalhada).
 - Confidencialidade da informação compartilhada.
 - Entre outros...

Gerenciando Informações do Projeto

- O processo Gerenciar as Comunicações tem quatro saídas:
 - › **comunicações do projeto:** geralmente consistem em relatórios de desempenho, *status* de entregas, progresso do cronograma e custo, etc;
 - › atualizações nos documentos do projeto;
 - › atualizações nos ativos de processos organizacionais;
 - › entre outros.

Gerência de Projetos de Software

Prof. Paulo Afonso

(slides desenvolvidos com base nos **Capítulos 8-11** do livro-texto da disciplina)

